

クリーンセンターニュース 建設工事だより 第15号

■発行者■
 秦野市伊勢原市環境衛生組合
 施設課(秦野市曾屋 4624 番地)
 Tel 0463-82-2500
 Fax 0463-83-5933
 E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp

平成 24 年 1 月 27 日 発行

焼却炉の据え付けを進めています。

クリーンセンターの心臓部である焼却炉は、昨年12月に搬入された火格子を中心に、組み立てを進めています。

クリーンセンターは、日量100tのごみを処理できる焼却炉を2炉備え、安定的にごみを処理できる施設です。




現在の焼却炉内部の様子(写真は乾燥・燃焼火格子付近)

ストーカ(火格子)式焼却炉とは？

ストーカ式焼却炉とは、ごみを多数の隙間のある火格子(ストーカ)の上で移動させて燃焼する焼却炉のことを言います。

【特長】

燃焼が安定しており、自動化・運転管理がしやすい。

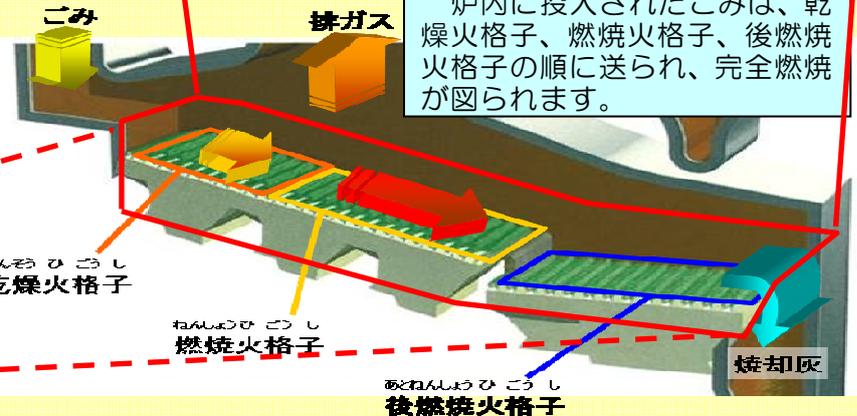

炉内に投入されたごみは、乾燥火格子、燃焼火格子、後燃焼火格子の順に送られ、完全燃焼が図られます。


～第3回建設工事現場見学会を実施します～

日時：平成 24 年 2 月 26 日(日)午前 10 時から 1 時間程度

場所：クリーンセンター建設現場(秦野市曾屋 4624 番地)

- * 事前の申し込みは不要です。当日、当組合事務所前にお集まりください。
- * 工事現場内のため、長靴等汚れても構わない服装でお越しください。
- * 小雨でも実施いたしますが、大雨等判断がつかない場合はお手数ですが、施設課(Tel 82-2500)まで確認をお願いいたします。

【クリーンセンター建設現場位置図】



前回見学会(H23.10実施)の様子

●スケジュール

建設工事の大まかなスケジュールをお知らせします。

	1月			2月			3月			4月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
工事種別	掘削工事	埋戻し工事						敷地内外周道路擁壁等工事・埋戻し工事					
	躯体工事				受変電棟工事(掘削・山留め・躯体工事)								
		地上部躯体工事											
	鉄骨工事												
		地下部躯体工事											
	外装工事												
					外装工事(外壁設置)								
	内装工事												
								内装工事					
	煙突工事	外筒工事			内筒工事								
	建築機械	準備・埋設管工事											
		建築機械設備・建築電気設備工事											
電気設備工事	建築機械設備・建築電気設備工事												
	プラント機械設備工事												
	プラント配管設備工事												
プラント工事	プラント電気設備工事												
大型搬入車両等	トレーラ 3~10台/日												
	コンクリートミキサー車 20~80台/日												
	10t大型トラック 4~15台/日												
場内建設機械等	クレーン 3~8台												
	コンクリートポンプ車 1~2台												
	油圧ショベル 2~6台												

※1月20日現在の予定です。工事の進捗により、内容を変更することがあります。

このニュースは、クリーンセンター建設用地周辺の自治会の皆さんにお届けするとともに、本組合のホームページにも掲載しています。
ご意見、ご質問等は下記へお寄せください。

■ 秦野市伊勢原市環境衛生組合 施設課 電話: 82-2500 FAX: 83-5933

ホームページ: <http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp>

E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp
