

# クリーンセンターニュース 建設工事だより 第20号


■発行者■  
秦野市伊勢原市環境衛生組合  
施設課(秦野市曾屋 4624 番地)  
Tel 0463-82-2500  
Fax 0463-83-5933  
E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp

平成 24 年 6 月 29 日 発行

## ▲クリーンセンター建設工事の進捗状況

現在、焼却炉の耐火レンガ工事やごみを焼却炉へ投入するごみクレーンの設置工事、工場棟の屋根工事や工場棟から煙突につながる排ガス煙道を囲う壁などの工事を行っています。今後も安全第一で進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

また、クリーンセンター前の市道63号線の拡幅整備については、現在、秦野市により用地交渉が進められています。

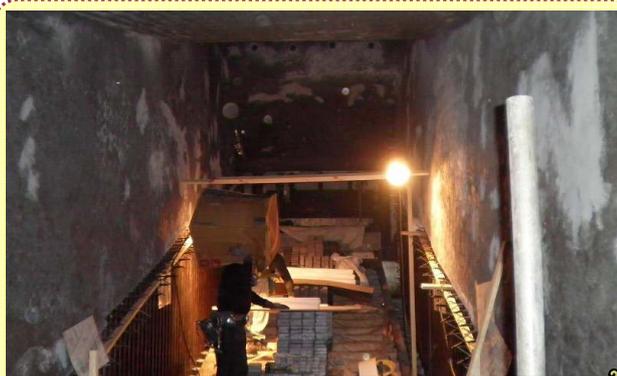

焼却炉内



ごみクレーン(本体)



工場棟



煙道囲い

## クリーンセンターの試験運転を開始します

本年8月上旬から、クリーンセンターの性能や機能を確認する試験運転を開始します。まず、各設備機器の動作確認を行い、その後、10月からごみを搬入し、11月には実際にごみを焼却していきます。

(※試験運転のスケジュールを裏面にお示しします※)

# ●スケジュール

建設工事の大まかなスケジュールをお知らせします。

工事種別	7月			8月			9月			10月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
掘削工事	敷地内外周道路擁壁等工事・埋戻工事・路盤・舗装工事											
躯体工事	地上部躯体工事			付属棟躯体工事								
鉄骨工事	工場棟鉄骨工事			付属棟鉄骨工事								
外装工事	外装工事											
内装工事	内装工事											
建築機械・電気設備工事	建築機械設備・建築電気設備工事（準備・埋設管工事含む）											
プラント工事	プラント設備（機械・配管・電気・計装）工事											
	プラント保温断熱工事											
	プラント耐火・築炉工事											
	プラント塗装工事											
	試験運転											
大型搬入車両等	ト レ ー ラ			1～6台/日			1～4台/日					
	コンクリートミキサー車			1～10台/日								
	10t大型トラック			4～20台/日								
場内建設機械等	クレーン			2～6台			0～2台					
	コンクリートポンプ車			0～1台								
	油圧ショベル			4～6台			4～8台			1～2台		

試験運転	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月		
	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬		
				無負荷運転開始 (機器単体運転)			火入れ乾燥焚き						(ごみの搬入開始)									本稼働 完成		

※6月20日現在の予定です。工事の進捗により、内容を変更することがあります。

このニュースは、クリーンセンター建設地周辺の自治会の皆さんにお届けするとともに、当組合ホームページにも掲載しています。  
ご意見、ご質問等は下記へお寄せください。

■ 秦野市伊勢原市環境衛生組合 施設課 電話: 82-2500 FAX: 83-5933

ホームページ: <http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp>

E-mail: [info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp](mailto:info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp)
